

RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETO

**Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IV
A/Córrego do Feijão**

**RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS EM PIOR ESTADO, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA
DO DER-MG/CONCLUSÃO DE CORREDOR LOGÍSTICO ESTRUTURANTE, CONFORME CRITÉRIOS
TÉCNICOS DA SEINFRA.**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2022



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Sumário

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO	3
a) Contextualização do Acordo	3
b) Anexo do Acordo:	3
c) Nome do projeto:	3
d) Objetivo:	3
e) Nome dos subprojetos, se houver, e objetivos:	4
f) Etapas da execução:	4
2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	5
a) Instrumento de entrada vinculado:	5
b) Dotações orçamentárias:.....	5
c) Contrato/convênio/instrumento firmado:.....	7
d) Execução orçamentária e financeira por ano:	9
3 – RESULTADOS	15
a) Resultados alcançados:.....	15
b) Entregas regionalizadas:	15
c) Evidências do cumprimento do objeto do projeto	16

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

a) Contextualização do Acordo

O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a Vale S.A. assinaram, em 04 de fevereiro de 2021, um Acordo Judicial. O documento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), define medidas para reparação aos impactos provocados pelo rompimento das barragens de Brumadinho. O valor definido no acordo foi de R\$37,6 bilhões e se divide em obrigações de fazer, obrigações de pagar e gastos com ações emergenciais.

O rompimento das barragens BI, B-IV e BIV-A da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos ambientais, econômicos e sociais.

Este documento faz parte da prestação de contas final de um dos projetos executados pelo Estado com recursos do Acordo, conforme estabelecido pela Deliberação COFIN nº 001/2022. O presente documento não substitui eventuais prestações de contas demandadas por órgãos de controle interno e externo, bem como pelas legislações aplicáveis. Cabe ao órgão executor do projeto a guarda documental e o fornecimento das informações demandadas.

b) Anexo do Acordo:

III – Mobilidade

c) Nome do projeto:

Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA.

d) Objetivo:

As obras de recuperação funcional do pavimento dos 9 (nove) segmentos concluídos em 2022, buscaram dotar as rodovias de melhorias na pista de rolamento. Concluídas as obras, os usuários contaram com os seguintes benefícios:

- Redução do tempo de viagem;
- Redução do custo de manutenção veicular;
- Diminuição do custo de transporte;
- Maior segurança e conforto;
- Facilitação de acesso aos equipamentos de saúde e educação.



e) Nome dos subprojetos, se houver, e objetivos:

Os objetivos foram tratados no item 1d.

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara, com 17,6 km de extensão;
- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral, com 15,3 km de extensão;
- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação, com 17,4 km de extensão;
- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso, com 19,8 km de extensão;
- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG 451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas, com 45,4 km de extensão;
- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas – Diamantina, com 30,4 km de extensão;
- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande, com 25,7 km de extensão;
- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci), com 13,0 km de extensão;
- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira, com 11,12 km de extensão.

f) Etapas da execução:

Os serviços de recuperação funcional do pavimento de segmentos rodoviários são executados em trechos já existentes e pavimentados. Assim as etapas são similares, quais sejam:

- Recuperação do pavimento (recuperação da camada asfáltica);
- Melhoria / recuperação da drenagem da rodovia;
- Sinalização.

No anexo I, é apresentado por trecho, as datas de início e término das obras e o cronograma de desembolso financeiro.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

a) Instrumento de entrada vinculado:

9288133 - Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA.

https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarEmpenho&ano=2023&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=60&id_projeto=60

b) Dotações orçamentárias:

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara:

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entr^o BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral:

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação:

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso:

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas:

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina:

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande:

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci):

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira:

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1

c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara:

DM-006/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=21797&Itemid=1000000000000



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral:

DM 011/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22142&Itemid=1000000000000

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação:

DM-007/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=21825&Itemid=1000000000000

- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso:

DM-012/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22143&Itemid=1000000000000

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas:

DM-009/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=21856&Itemid=1000000000000

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina:

DM-023/2021

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=22240&Itemid=1000000000000

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande:

DM-018/2022

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1311&id=24117&Itemid=1000000000000



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci):

PRC-22.090/2013

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1298&id=30127&Itemid=1000000000000

- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira:

DM-021/2022

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=23961&Itemid=1000000000000

d) Execução orçamentária e financeira por ano:

Tabela 1: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	R\$ 1.923.408,34	R\$ 808.940,53	R\$ 1.114.467,81	R\$ 10.817,27	R\$ 10.817,27		R\$ 1.934.225,61	R\$ 1.934.225,61
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis	R\$ 2.276.584,10	R\$ 1.922.770,64	R\$ 353.813,46				R\$ 2.276.584,10	R\$ 2.276.584,10
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	R\$ 30.387,95	R\$ 25.896,84	R\$ 4.491,11				R\$ 30.387,95	R\$ 30.387,95
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)	R\$ 18.471,22	R\$ 18.471,22		R\$ 11.747,08	R\$ 11.747,08		R\$ 30.218,30	R\$ 30.218,30
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 4.248.851,61	R\$ 2.776.079,23	R\$ 1.472.772,38	R\$ 22.564,35	R\$ 22.564,35	R\$ 0,00	R\$ 4.271.415,96	R\$ 4.271.415,96

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 2: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entr^o BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	R\$ 3.916.425,32	R\$ 818.910,82	R\$ 3.097.514,50	R\$ 633.402,94	R\$ 633.402,94		R\$ 4.549.828,26	R\$ 4.549.828,26
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis	R\$ 3.793.886,00	R\$ 1.031.170,03	R\$ 2.762.715,97	R\$ 501.836,13	R\$ 501.836,13		R\$ 4.295.722,13	R\$ 4.295.722,13
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	R\$ 131.947,25	R\$ 37.360,59	R\$ 94.586,66	R\$ 22.134,71	R\$ 22.134,71		R\$ 154.081,96	R\$ 154.081,96
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)	R\$ 109.303,51	R\$ 109.303,51		R\$ 25.925,80	R\$ 25.925,80		R\$ 135.229,31	R\$ 135.229,31
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 6.678,68	-R\$ 6.678,68		-R\$ 6.678,68	-R\$ 6.678,68
Total geral	R\$ 7.951.562,08	R\$ 1.996.744,95	R\$ 5.954.817,13	R\$ 1.176.620,90	R\$ 1.176.620,90	R\$ 0,00	R\$ 9.128.182,98	R\$ 9.128.182,98

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 3: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entr^o MG-173 (Paraisópolis) – Consolação:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	R\$ 2.330.420,73	R\$ 1.503.528,28	R\$ 826.892,45	R\$ 1.681.351,74	R\$ 1.681.351,74		R\$ 4.011.772,47	R\$ 4.011.772,47
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis	R\$ 2.020.352,15	R\$ 2.020.352,15		R\$ 392.466,94	R\$ 392.466,94		R\$ 2.412.819,09	R\$ 2.412.819,09
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	R\$ 76.904,25	R\$ 76.904,25		R\$ 17.999,50	R\$ 17.999,50		R\$ 94.903,75	R\$ 94.903,75
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo	R\$ 7.741,75	R\$ 7.741,75		R\$ 7.585,13	R\$ 7.585,13		R\$ 15.326,88	R\$ 15.326,88



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

(realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)								
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 4.435.418,88	R\$ 3.608.526,43	R\$ 826.892,45	R\$ 2.099.403,31	R\$ 2.099.403,31	R\$ 0,00	R\$ 6.534.822,19	R\$ 6.534.822,19

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 4: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entr^o MG-347 - Dom Viçoso:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	R\$ 4.896.420,52	R\$ 103.158,47	R\$ 4.793.262,05	R\$ 3.060.234,58	R\$ 3.060.234,58		R\$ 7.956.655,10	R\$ 7.956.655,10
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis				R\$ 4.396.340,84	R\$ 4.396.340,84		R\$ 4.396.340,84	R\$ 4.396.340,84
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais				R\$ 146.696,05	R\$ 146.696,05		R\$ 146.696,05	R\$ 146.696,05
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				R\$ 47.974,45	R\$ 47.974,45		R\$ 47.974,45	R\$ 47.974,45
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 16.798,28	-R\$ 16.798,28		-R\$ 16.798,28	-R\$ 16.798,28
Total geral	R\$ 4.896.420,52	R\$ 103.158,47	R\$ 4.793.262,05	R\$ 7.634.447,63	R\$ 7.634.447,63	R\$ 0,00	R\$ 12.530.868,15	R\$ 12.530.868,15

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Tabela 5: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	R\$ 7.276.572,49	R\$ 262.774,17	R\$ 7.013.798,32	R\$ 7.635.199,25	R\$ 7.635.199,25		R\$ 14.911.771,74	R\$ 14.911.771,74
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis	R\$ 237.729,54	R\$ 137.420,15	R\$ 100.309,39	R\$ 8.809.391,84	R\$ 8.809.391,84		R\$ 9.047.121,38	R\$ 9.047.121,38
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	R\$ 11.049,23	R\$ 6.363,36	R\$ 4.685,87	R\$ 521.201,65	R\$ 521.201,65		R\$ 532.250,88	R\$ 532.250,88
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)	R\$ 8.718,27	R\$ 8.718,27		R\$ 130.218,90	R\$ 130.218,90		R\$ 138.937,16	R\$ 138.937,16
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)	R\$ 0,00			-R\$ 28.740,53	-R\$ 28.740,53		-R\$ 28.740,53	-R\$ 28.740,53
Total geral	R\$ 7.534.069,53	R\$ 415.275,95	R\$ 7.118.793,58	R\$ 17.067.271,11	R\$ 17.067.271,11	R\$ 0,00	R\$ 24.601.340,64	R\$ 24.601.340,64

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 6: Execução por ano

Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis				R\$ 10.029.334,00	R\$ 9.853.104,03	R\$ 176.229,97	R\$ 10.029.334,00	R\$ 10.029.334,00
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis				R\$ 5.074.486,92	R\$ 5.074.486,92		R\$ 5.074.486,92	R\$ 5.074.486,92
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais				R\$ 192.711,59	R\$ 192.711,59		R\$ 192.711,59	R\$ 192.711,59



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				R\$ 32.250,83	R\$ 32.250,83		R\$ 32.250,83	R\$ 32.250,83
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 7.308,30	-R\$ 7.308,30		-R\$ 7.308,30	-R\$ 7.308,30
Total geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.321.475,04	R\$ 15.145.245,07	R\$ 176.229,97	R\$ 15.321.475,04	R\$ 15.321.475,04

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 7: Execução por ano

Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis				R\$ 2.295.805,98	R\$ 2.295.805,98		R\$ 2.295.805,98	R\$ 2.295.805,98
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis				R\$ 2.047.223,81	R\$ 2.047.223,81		R\$ 2.047.223,81	R\$ 2.047.223,81
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais				R\$ 94.376,57	R\$ 94.376,57		R\$ 94.376,57	R\$ 94.376,57
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 12.873,73	-R\$ 12.873,73		-R\$ 12.873,73	-R\$ 12.873,73
Total geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.424.532,63	R\$ 4.424.532,63	R\$ 0,00	R\$ 4.424.532,63	R\$ 4.424.532,63

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Tabela 8: Execução por ano

Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci):

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis				R\$ 9.060.583,26	R\$ 9.060.583,26		R\$ 9.060.583,26	R\$ 9.060.583,26
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis				R\$ 3.465.851,47	R\$ 3.465.851,47		R\$ 3.465.851,47	R\$ 3.465.851,47
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais				R\$ 117.330,25	R\$ 117.330,25		R\$ 117.330,25	R\$ 117.330,25
9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				R\$ 14.338,08	R\$ 14.338,08		R\$ 14.338,08	R\$ 14.338,08
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 174.105,69	-R\$ 174.105,69		-R\$ 174.105,69	-R\$ 174.105,69
Total geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.483.997,37	R\$ 12.483.997,37	R\$ 0,00	R\$ 12.483.997,37	R\$ 12.483.997,37

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Tabela 9: Execução por ano

Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira:

Código e Descrição do elemento item de despesa	2021			2022			Total	Total
	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Empenhado	Pago
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis				R\$ 4.747.577,24	R\$ 4.747.577,24		R\$ 4.747.577,24	R\$ 4.747.577,24
5112 - Material para obras - Bens não patrimoniáveis				R\$ 2.051.528,69	R\$ 2.051.528,69		R\$ 2.051.528,69	R\$ 2.051.528,69
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais				R\$ 19.208,97	R\$ 19.208,97		R\$ 19.208,97	R\$ 19.208,97



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

9399 - Outras indenizações e restituições - Acréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				R\$ 14.026,67	R\$ 14.026,67		R\$ 14.026,67	R\$ 14.026,67
Decréscimo (realinhamento de preço do fornecimento do material betuminoso)				-R\$ 18.751,14	-R\$ 18.751,14		-R\$ 18.751,14	-R\$ 18.751,14
Total geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.813.590,43	R\$ 6.813.590,43	R\$ 0,00	R\$ 6.813.590,43	R\$ 6.813.590,43

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

3 – RESULTADOS


a) Resultados alcançados:

Conforme informado no item 1d, os resultados gerais foram:

- Redução do tempo de viagem;
- Redução do custo de manutenção veicular;
- Diminuição do custo de transporte;
- Maior segurança e conforto;
- Facilitação de acesso aos equipamentos de saúde e educação.

b) Entregas regionalizadas:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	MUNICÍPIOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS	POPULAÇÃO DIRETAMENTE BENEFICIADA
MG-040	Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara	17,6	Crucilândia, Itaguara	19.280
MGC-262	Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido da Silveira	11,12	Sabará	129.380
LMG-744	Virgolândia - Entrº MGC-314 (p/ Coroaci)	13,0	Virgolândia, Coroaci	15.436
CMG-367	Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas	45,4	Couto de Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio Preto	7.277
CMG-367	Couto de Magalhães de Minas - Diamantina	30,4	Couto de Magalhães de Minas, Diamantina	51.947



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

LMG-740	Entrº MG-410 - Lagoa Grande	25,7	Lagoa Grande	26.062
MG-295	Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação	17,4	Paraisópolis, Consolação	22.008
MG-295	Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral	15,3	CambuÍ, Senador Amaral	35.742
LMG-883	Entrº MG-347 - Dom Viçoso	19,8	Carmo de Minas, Dom Viçoso	16.892

c) Evidências do cumprimento do objeto do projeto:

Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara	Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido da Silveira
	
Virgolândia - Entrº MGC-314 (p/ Coroaci)	Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas
	



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br




**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Couto de Magalhães de Minas - Diamantina



Entrº MG-410 - Lagoa Grande

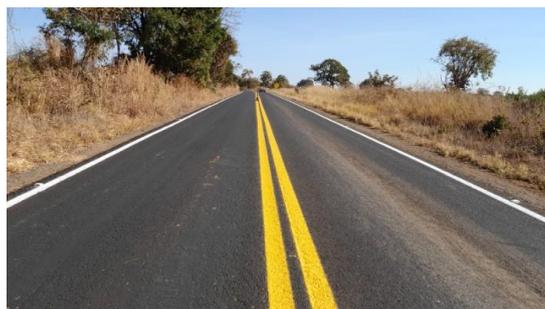

Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação



Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral



Entrº MG-347 - Dom Viçoso



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Belo Horizonte, 05 de Janeiro de 2024.

Rodrigo Rodrigues Tavares

Diretor Geral

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

www.probrumadinho.mg.gov.br



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.
